JÄTEVEDEN IMEYTYSJÄRJESTELMÄ (5,0 m³)

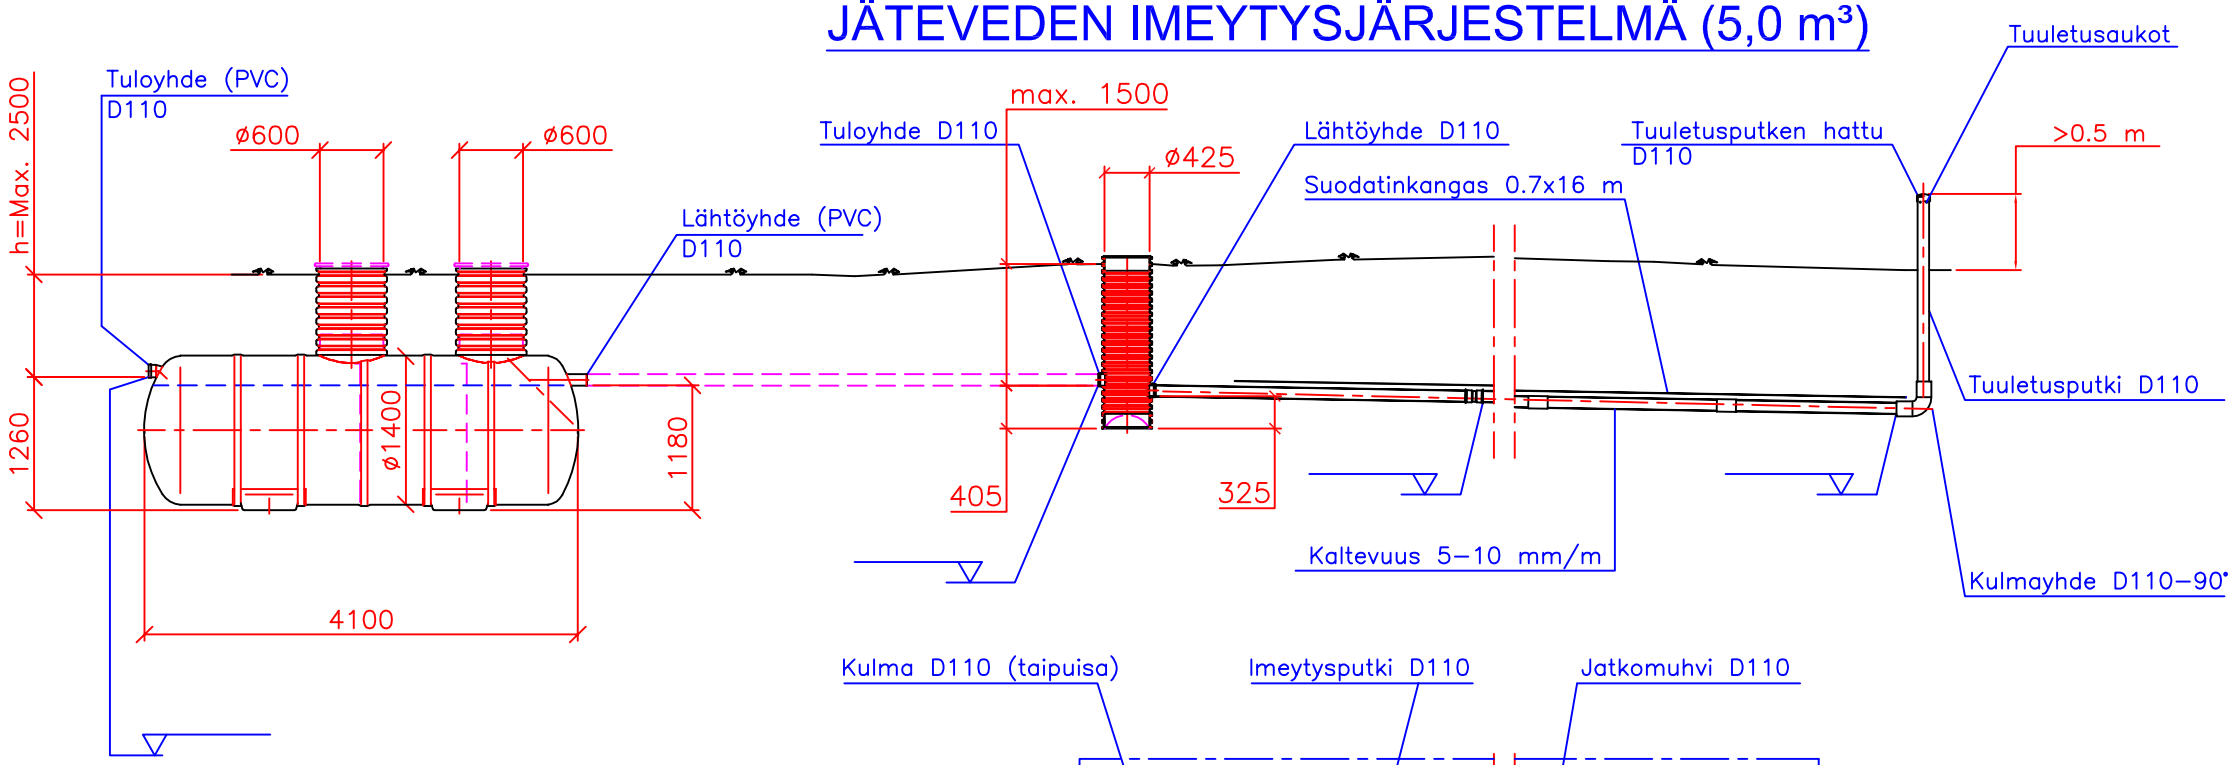

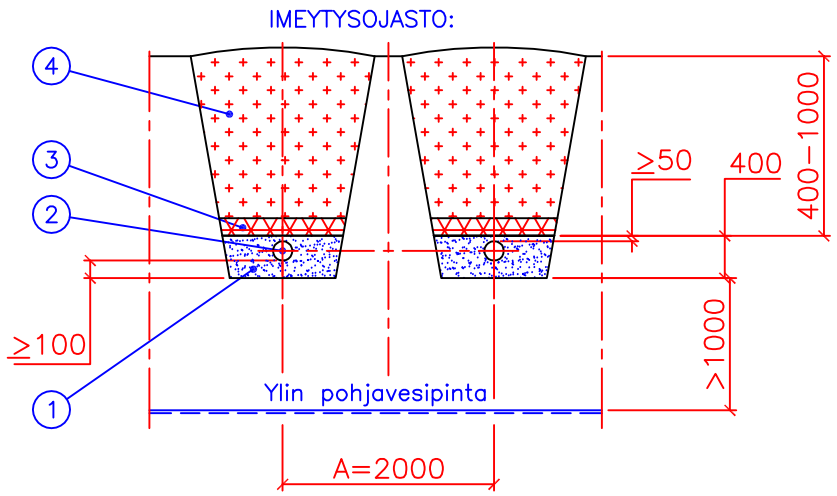

1 Jakokerros (pesty sepeli, raekoko 16–32 mm)
2 Imeytysputkisto
3 Suodatinkangas/lämmöneriste
4 Täytemaa

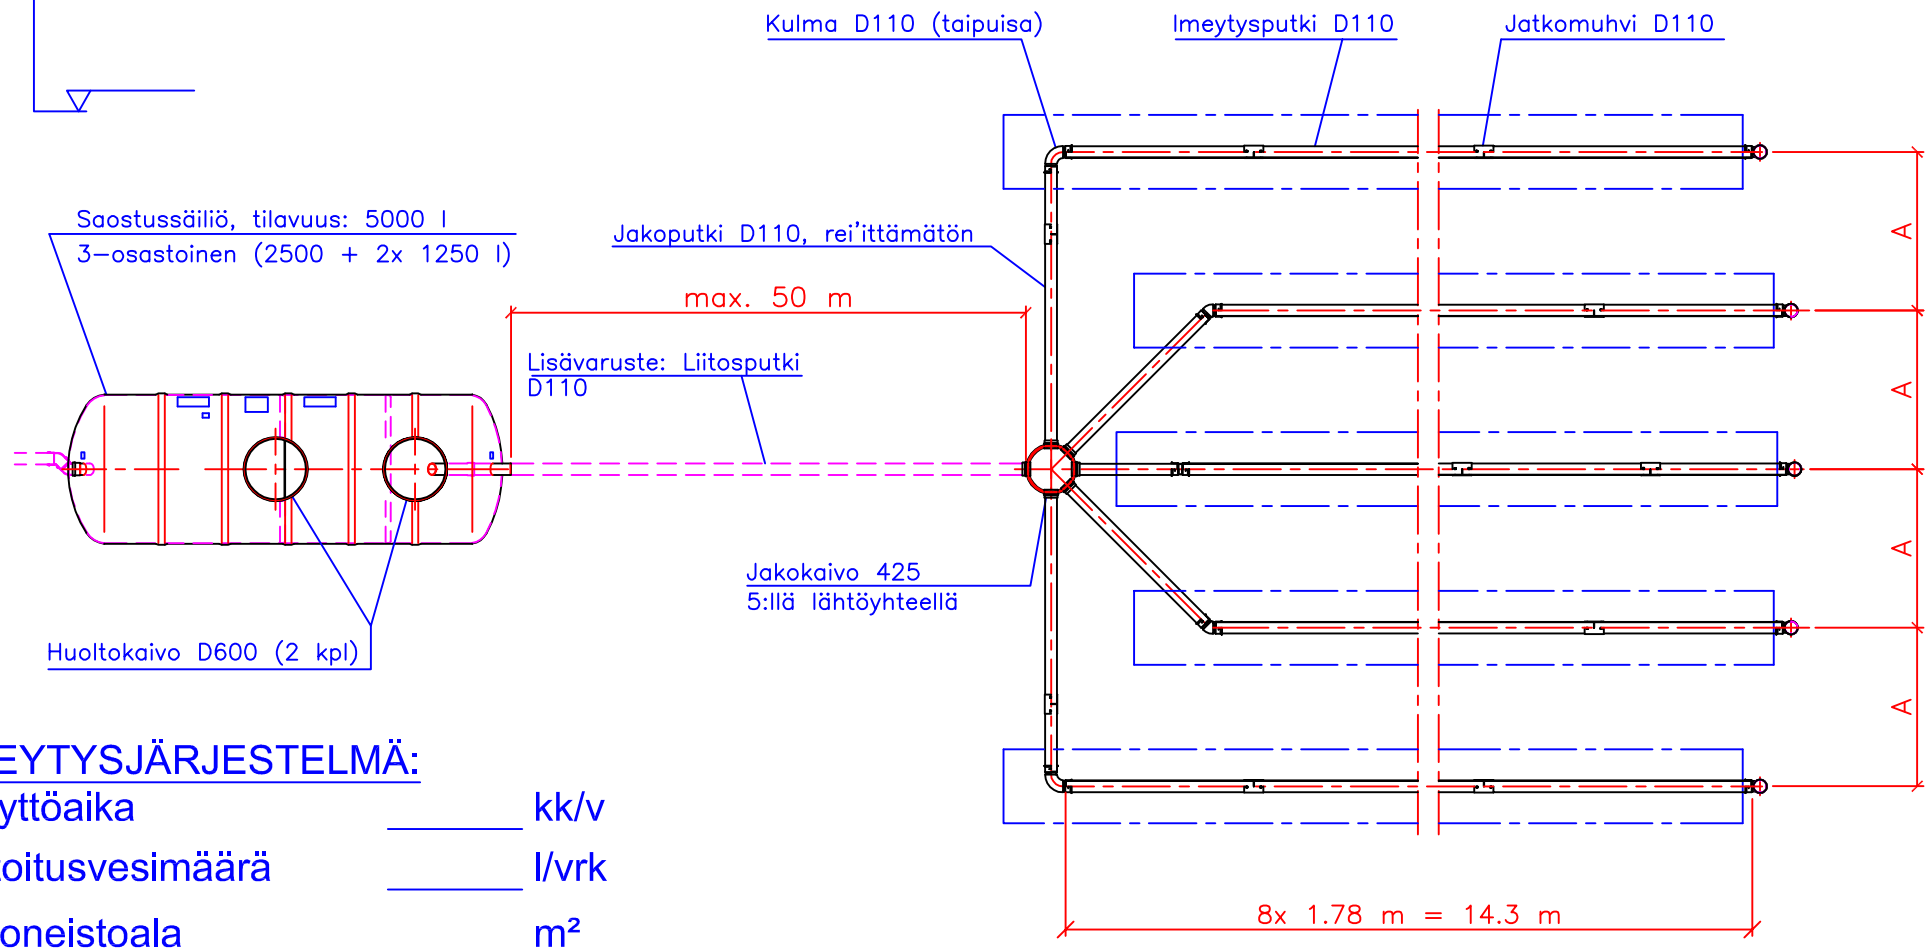

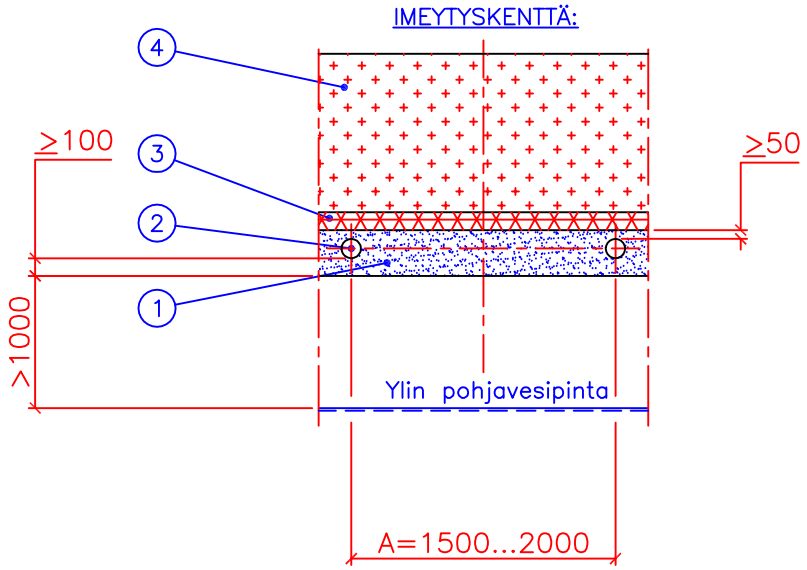

IMEYTYSJÄRJESTELMÄ:

Käyttöaika _____ kk/v
Mitoitusvesimäärä _____ l/vrk
Huoneistoala _____ m²
Henkilömäärä _____ henkilöä

SAOSTUSSÄILIÖ:

- ☐ harmaat jätevedet
- ☐ kaikki jätevedet
- ☐ ankkurointi
- ☐ lämpöeristys

IMEYTTÄMÖ:

Imeytysputkilinjojen lukumäärä _____ kpl
Imeytysputkiston kokonaispituus _____ m
Jätevesimäärä/putkimetri/vrk _____ l/m/vrk

- ☐ imeytysojasto
- ☐ imeytyskenttä
- ☐ lämpöeristys

wavin Labko
Piir.no: 55EG10_s

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat LABKO SAKO 5000/600L imeytysjärjestelmä
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o Muutos
